援航 · 运输调度与资源报告

镇龙乡 · 应急运输演练

本地模拟 / 规划辅助 · 在声明模型范围内可行


方案 PLAN-397F303573424962　　快照 SNAP-E40476E29C4F4B19 · v1
场景起点 2026-10-17T08:00:00+08:00（Asia/Shanghai）　　生成 2026-10-18T03:37:21.143776+00:00
输入Hash 71be44d42920c4a014dd3b41a8abad9069d8099349607f870f22712b6d1848a4

已安排箱件	最后交付 / 全部返航	预计总能耗	最低返航SOC
32 / 32	**02:02:08** 返航 02:07:20	**23.310 kWh**	**27.1%** 策略下限 20.0%

这是计划任务单，不是实时执行事实或飞控指令。表内时间为相对场景起点的时分秒，按最近秒显示；JSON保留原精度。费用未配置，不计算人民币。验证范围：cargo_unique, capacity, inventory, aircraft, battery, time_window, energy, terrain。

一、运输航线与站点

WGS84坐标示意 · 任务级运输路线 · 非实时障碍图

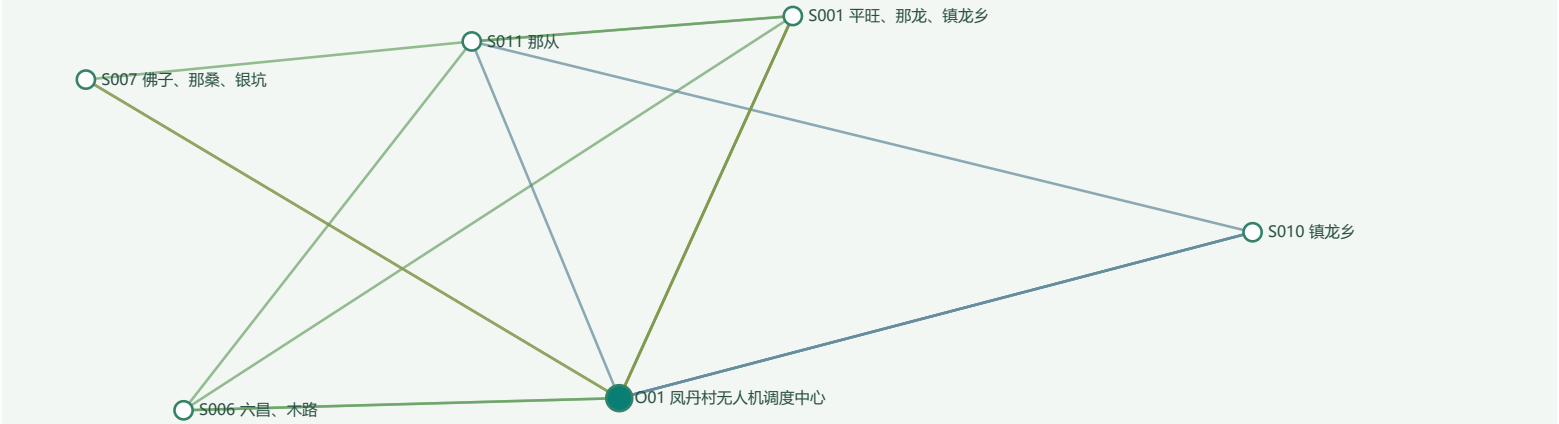

二、架次任务单

机体 / 电池	稳定架次ID	访问点 / 交接完成	准备 / 起飞 / 返航	箱件追踪	能耗 / 返航 SOC
U01 BAT-A-01	SRT-0effebcce24d	S011 那从 · T+00:14:53 S010 镇龙乡 · T+00:28:22	T+00:00:00 起飞 T+00:06:30 返航 T+00:37:32	3箱 S011-MED-01, S010-MED-01, S010-WAT-01	2.795 kWh SOC 37.9%
U05 BAT-B-01	SRT-493807468ae3	S007 佛子、那桑、银坑 · T+00:18:46	T+00:00:00 起飞 T+00:06:30 返航 T+00:27:16	3箱 S007-MED-01, S007-WAT-01, S007-FOD-01	1.780 kWh SOC 55.5%
U07 BAT-C-01	SRT-6396ff71573f	S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:21:18 S006 六昌、木路 · T+00:32:51	T+00:00:00 起飞 T+00:09:00 返航 T+00:38:43	8箱 S001-MED-01, S001-MED-02, S001-WAT-01, S001-WAT-02, S001-WAT-03, S001-WAT-04, S001-WAT-05, S006-MED-01	4.762 kWh SOC 40.5%
U05 BAT-B-02	SRT-3147f654c6cd	S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:41:34	T+00:27:16 起飞 T+00:33:16 返航 T+00:46:25	2箱 S001-WAT-06, S001-WAT-07	1.220 kWh SOC 69.5%
U01 BAT-A-02	SRT-c7fb7356a90d	S010 镇龙乡 · T+00:54:57	T+00:37:32 起飞 T+00:43:02 返航 T+01:04:07	1箱 S010-FOD-01	1.868 kWh SOC 58.5%
U07 BAT-C-02	SRT-4b12e7d95fbd	S006 六昌、木路 · T+00:58:46 S011 那从 · T+01:08:18 S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+01:15:43	T+00:38:43 起飞 T+00:47:13 返航 T+01:20:55	7箱 S006-WAT-01, S006-WAT-02, S006-WAT-03, S006-FOD-01, S006-HYG-01, S011-WAT-01, S001-FOD-01	5.055 kWh SOC 36.8%
U07 BAT-C-01	SRT-cf3a18537124	S007 佛子、那桑、银坑 · T+01:43:05 S011 那从 · T+01:52:19 S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+02:02:08	T+01:20:55 起飞 T+01:29:55 返航 T+02:07:20	8箱 S007-WAT-02, S007-HYG-01, S011-FOD-01, S001-WAT-08, S001-FOD-02, S001-FOD-03, S001-HYG-01, S001-HYG-02	5.829 kWh SOC 27.1%

三、需求交付与时间要求

硬截止违约 0 条；期望延期 4 条。期望时限和硬约束分开统计。

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S001-MED-01	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S001-MED-02	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S001-WAT-01	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S001-WAT-02	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-03	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-04	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-05	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-06	S001	1/1	00:41:34	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-07	S001	1/1	00:41:34	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-08	S001	1/1	02:02:08	01:00:00	—	01:02:08
D-S001-FOD-01	S001	1/1	01:15:43	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-02	S001	1/1	02:02:08	02:00:00	—	00:02:08
D-S001-FOD-03	S001	1/1	02:02:08	02:00:00	—	00:02:08
D-S001-HYG-01	S001	1/1	02:02:08	03:00:00	—	00:00:00
D-S001-HYG-02	S001	1/1	02:02:08	03:00:00	—	00:00:00
D-S006-MED-01	S006	1/1	00:32:51	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S006-WAT-01	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S006-WAT-02	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-WAT-03	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-FOD-01	S006	1/1	00:58:46	02:00:00	—	00:00:00
D-S006-HYG-01	S006	1/1	00:58:46	03:00:00	—	00:00:00

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S007-MED-01	S007	1/1	00:18:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S007-WAT-01	S007	1/1	00:18:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S007-WAT-02	S007	1/1	01:43:05	01:00:00	—	00:43:05
D-S007-FOD-01	S007	1/1	00:18:46	02:00:00	—	00:00:00
D-S007-HYG-01	S007	1/1	01:43:05	03:00:00	—	00:00:00
D-S010-MED-01	S010	1/1	00:28:22	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S010-WAT-01	S010	1/1	00:28:22	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S010-FOD-01	S010	1/1	00:54:57	02:00:00	—	00:00:00
D-S011-MED-01	S011	1/1	00:14:53	03:00:00	03:00:00	00:00:00
D-S011-WAT-01	S011	1/1	01:08:18	03:00:00	03:00:00	00:00:00
D-S011-FOD-01	S011	1/1	01:52:19	04:00:00	—	00:00:00

四、资源占用

无限充电端口模型下的并发补能峰值 4 块；最小硬截止余量 00:01:14。这不是最少购买数量证明。

资源类型	实体 / 机型	架次	计划占用时长	计划占用率	累计能耗
运输机体	U01 · A型	2	01:04:07	50.3%	4.663 kWh
运输机体	U05 · B型	2	00:46:25	36.5%	3.000 kWh
运输机体	U07 · C型	3	02:07:20	100.0%	15.647 kWh
运输电池	BAT-A-01 · A型	1	00:59:19	35.4%	2.795 kWh
运输电池	BAT-A-02 · A型	1	00:43:54	26.2%	1.868 kWh
运输电池	BAT-B-01 · B型	1	00:51:14	30.6%	1.780 kWh
运输电池	BAT-B-02 · B型	1	00:39:05	23.3%	1.220 kWh
运输电池	BAT-C-01 · C型	2	02:40:43	95.9%	10.591 kWh

资源类型	实体 / 机型	架次	计划占用时长	计划占用率	累计能耗
运输电池	BAT-C-02 · C型	1	01:18:54	47.1%	5.055 kWh

五、逐箱物资追踪

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S001-FOD-01	D-S001-FOD-01	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+01:15:43
S001-FOD-02	D-S001-FOD-02	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+02:02:08
S001-FOD-03	D-S001-FOD-03	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+02:02:08
S001-HYG-01	D-S001-HYG-01	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+02:02:08
S001-HYG-02	D-S001-HYG-02	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+02:02:08
S001-MED-01	D-S001-MED-01	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-MED-02	D-S001-MED-02	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-01	D-S001-WAT-01	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-02	D-S001-WAT-02	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-03	D-S001-WAT-03	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-04	D-S001-WAT-04	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-05	D-S001-WAT-05	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-06	D-S001-WAT-06	S001	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-02	T+00:41:34
S001-WAT-07	D-S001-WAT-07	S001	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-02	T+00:41:34
S001-WAT-08	D-S001-WAT-08	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+02:02:08
S006-FOD-01	D-S006-FOD-01	S006	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-HYG-01	D-S006-HYG-01	S006	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-MED-01	D-S006-MED-01	S006	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:32:51
S006-WAT-01	D-S006-WAT-01	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S006-WAT-02	D-S006-WAT-02	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-WAT-03	D-S006-WAT-03	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S007-FOD-01	D-S007-FOD-01	S007	8 kg / 28 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-HYG-01	D-S007-HYG-01	S007	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+01:43:05
S007-MED-01	D-S007-MED-01	S007	3 kg / 12 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-WAT-01	D-S007-WAT-01	S007	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-WAT-02	D-S007-WAT-02	S007	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:43:05
S010-FOD-01	D-S010-FOD-01	S010	8 kg / 28 L	U01 / BAT-A-02	T+00:54:57
S010-MED-01	D-S010-MED-01	S010	3 kg / 12 L	U01 / BAT-A-01	T+00:28:22
S010-WAT-01	D-S010-WAT-01	S010	14 kg / 27 L	U01 / BAT-A-01	T+00:28:22
S011-FOD-01	D-S011-FOD-01	S011	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:52:19
S011-MED-01	D-S011-MED-01	S011	3 kg / 12 L	U01 / BAT-A-01	T+00:14:53
S011-WAT-01	D-S011-WAT-01	S011	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+01:08:18

六、独立检查与模型边界

cargo_unique · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

capacity · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

inventory · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

aircraft · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

battery · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

time_window · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

energy · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

terrain · 通过：绑定DEM闭像元航段净空已检查；非现实障碍/适航认证

communication · 未评估：当前方案未要求连续无线链路检查

- 真实限时多起点插入启发式；未证明全局最优。
- 共同排序先减少优先级加权逐箱期望延期，再比较所选时间/能耗/均衡目标；更优方案可能增加另一指标。
- 题设载荷能耗、两段充电；充电端口无限。
- 航段为WGS84测地线近似；不包含风雨、实时障碍与全航程多机避碰。
- 通信未评估；输出为仿真/规划建议，不是实飞许可。
- 占用率按该类资源从场景零点至最后释放计，属于计划占用，不是设备实测统计。
- 充电峰值为现有无限端口模型的并发需求，不代表已考虑端口容量。
- 期望截止允许延期；硬截止必须通过独立检查。
- 初始充电仅在本次方案实际先补能时计入。
